

APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

Nombre de la Obra: OBRA TORRE 3

Semana del: 25 AL 31 DE JULIO 2026

TIEMPO ACUMULADO DE OBRA EN DIAS: 543 DIAS

Jefe de Obra: MAURO PONCHIETTI

1. TAREAS REALIZADAS

TAREA 1: APLICACIÓN DE ESPUMA POLIURETÁNICA EN CUBIERTA NIVEL 6

- Porcentaje de avance semanal: 50%
- Porcentaje de avance acumulado: 90%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31




APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

TAREA 2: INSTALACION ELECTRICA (CAÑERIA Y CAJAS) NIVEL 3

- Porcentaje de avance semanal: 25%
- Porcentaje de avance acumulado: 95%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

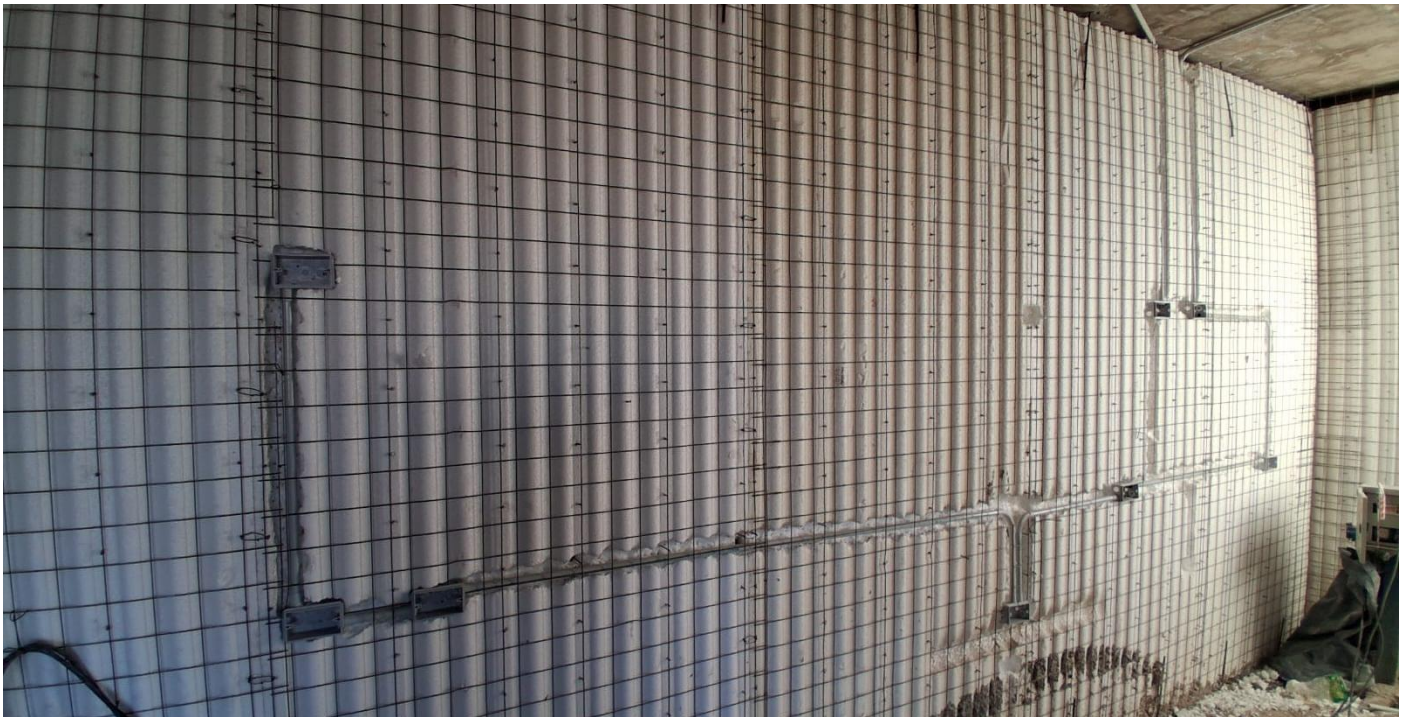

TAREA 3: INSTALACIÓN LOSA RADIANTE NIVEL 2

- Porcentaje de avance semanal: 20%
- Porcentaje de avance acumulado: 20%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31



TAREA 4: CHICOTEADO Y REVOQUES NIVEL 3

- Porcentaje de avance semanal: 60%
- Porcentaje de avance acumulado: 90%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31




APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

TAREA 5: INSTALACION DE GAS NIVEL 2

- Porcentaje de avance semanal: 35%
- Porcentaje de avance acumulado: 100%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad: SE REALIZAN PRUEBAS DE HERMETICIDAD
- Colocar fotos representativas de esta tarea



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL	OBRA TORRE 3
	OBRA	Fecha: 2026-07-31

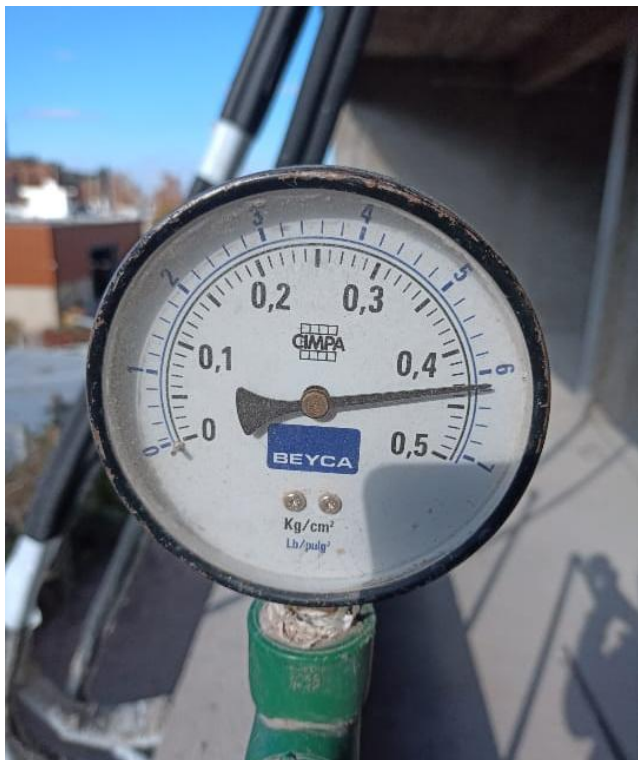

TAREA 6: BOLSEADO MURO OESTE

- Porcentaje de avance semanal: 0%
- Porcentaje de avance acumulado: 70%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea

TAREA 7: BOLSEADO MURO ESTE

- Porcentaje de avance semanal: 0%
- Porcentaje de avance acumulado: 75%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea

TAREA 8: LIMPIEZA Y RETIRO DE DESENCOFRADO PISO 6

- Porcentaje de avance semanal: 0%
- Porcentaje de avance acumulado: 90%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea

TAREA 9: COLOCACION DE CAJAS Y COBRE PRE INSTALACION AA TERMOMECAÁNICA

- Porcentaje de avance semanal: 10%
- Porcentaje de avance acumulado: 60%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad: NIVEL 3, 4 Y 5
- Colocar fotos representativas de esta tarea

APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

TAREA 10: INSTALACION DE AGUA Y CLOACA NIVEL 3

- Porcentaje de avance semanal: 10%
- Porcentaje de avance acumulado: 25%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad: TAREA RETRASADA POR FALTA DE PERSONAL. SE LE SOLICITA AL SR. VARGAS EL INCREMENTO DE PERSONAL PARA ALCANZAR EL OBJETIVO.
- Colocar fotos representativas de esta tarea:



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

TAREA 11: CARPETA DE NIVELACIÓN NIVEL 6

- Porcentaje de avance semanal: 0%
- Porcentaje de avance acumulado: 90%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad: TAMBIÉN EN CUBIERTA DE CAJA DE ESCALERA
- Colocar fotos representativas de esta tarea

TAREA 12: BOLSEADO NORTE

- Porcentaje de avance semanal: 0%
- Porcentaje de avance acumulado: 70%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea

TAREA 13: REALIZACIÓN DE PASES EN NIVEL 3

- Porcentaje de avance semanal: 15%
- Porcentaje de avance acumulado: 15%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea



APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

AREA 14: INSTALACION CAÑERIA SISTEMA DE INCENDIOS N-1


- Porcentaje de avance semanal: 0%
- Porcentaje de avance acumulado: 80%
- Observaciones o inconvenientes sobre actividad:
- Colocar fotos representativas de esta tarea

MATERIALES, MAQUINAS Y/O EQUIPOS DE MAYOR INCIDENCIA UTILIZADOS POR CADA TAREA DESCRIPTA EN PUNTO1.

TAREA	MATERIAL	USO PRINCIPAL	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	ESPUMA POLIURETÁNICA	HS HOMBRE	HS	54	
2	CAÑOS CAJAS	HS HOMBRE	HS	160	
3	MANTA AISLANTE MALLA ELECTROSOLDADA	LOSA RADIANTE	HS	32	
4	CEMENTO ARENA	HS HOMBRE	HS	360	
5	CAÑOS ACCESORIOS	HS HOMBRE	HS	80	
10	CAÑOS ACCESORIOS	HS HOMBRE	HS	80	
13	MÁQUINA SACABOCADOS	HS HOMBRE	HS	16	

APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

2. AVANCE DE OBRA

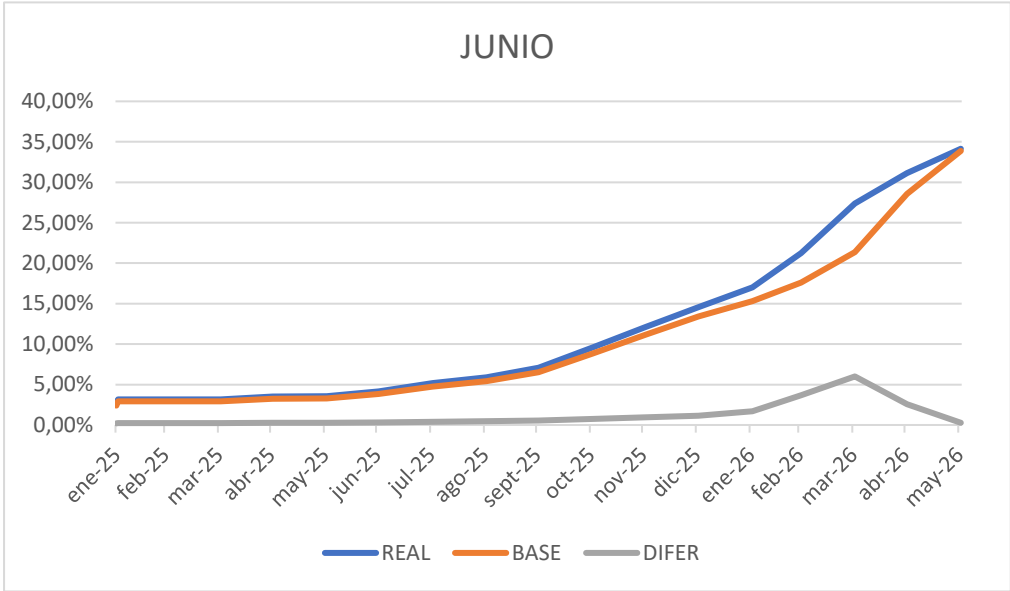

3. ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OBRA

P: PRESENTE
A: AUSENTE
R.A. RETIRA ANTES
F: FERIADO

CONTROL DE PERSONAL TORRE 3		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		27/7/2026	28/7/2026	29/7/2026	30/7/2026	31/7/2026
ACHU	HIERRRO					
	ENCOFRADO					
	CASAFORMA					
	DESENCOFRADO					
	REVOcando	8	8	10	10	10
	BOLSEADO					
PROPIO	VARIOS	4	4	4	4	4
	PLOMERO					
MAQUINISTA	MOVIMIENTO DE SUELO - MIX					
	INSPECCION					
MENDOTICA	ELECTRICOS	4	4	4	4	4
PLOMERO	AGUA/CLOACA/GAS	3	5	5	4	4
MIRANDA	CONTRAPISOS					
TERMOMECANICA	AA - LOSA RADIANTE				3	
ESPUMA POLIURETANICA	CUBIERTA NIVEL 6	2	2			
HIDROBOMBA	SIST. CONTRAINCENDIO					
CAMION	HORMIGON/FLETE					
TOTAL		21	23	23	25	22

APOLO SUR S.A. Construcciones	REPORTE SEMANAL OBRA	OBRA TORRE 3
		Fecha: 2026-07-31

4. OBSERVACIONES GENERALES REFERENTE A LA OBRA

- MENDÓTICA ALCANZÓ EL AVANCE ESTIPULADO
- SE VUELVE CRÍTICO EL AVANCE DE VARGAS EN LA PARTE SANITARIA, SE INCISTE EN EL AUMENTO DE PERSONAL.
- SE DEJA SIN REALIZAR LA AISLACIÓN DE CUBIERTA EN EL BALCÓN SUR NIVEL 6, HASTA TANTO LLEGUEN LOS MATERIALES DE REVESTIMIENTO EXTERIOR, SE REALICE A TAREA Y SE DESMONTE EL ANDAMIAJE.
- EL LUNES PRÓXIMO, SE CONTINÚA CON EL TENDIDO DE MANTAS Y MANGUERAS DE LOSAS RADIANTES DEL NIVEL 2.
- A PARTIR DEL MIÉRCOLES 05/08 MIRANDA ALEJANDRO COMIENZA CON LAS FAJAS DE CONTRAPISO SOBRELOSAS N-2

5. MEDICION Y CLASIFICACION DE RDC (RESIDUOS DE CONSTR. Y DEMOL.)

Tipo de Residuo	Volumen Generado esta semana (m³)	Ubicación / Tarea Asociada	Descripción Técnica / Observaciones	Volumen Total acumulado desde inicio de obra (m³)	DEPOSICIÓN
Residuos Inertes	1.0 3.0	ARMADO DE ESTRUCTURAS	Recorte de madera ESCOMBROS Hº	27.50 m3 79.00 M3	
Residuos No Inertes	0,25 M3	COMIDA DEL PERSONAL	BOTELLAS PLAST BANDEJA COMIDA	8.75 M3	
Residuos Peligrosos					
